

Prozess- veränderung nachhaltig führen

Rollenklärung, Stakeholder, Widerstand produktiv machen –
Befähigen und Verankern mit messbarer Wirksamkeit.

Lehrskript – Tag 15 von 16

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Dozent:
Can Siebert

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

Prozessveränderungen scheitern selten an der Methode – sie scheitern am Menschen, an unklaren Rollen und an fehlender Verankerung. Heute lernen Sie, Veränderungen *nachhaltig zu führen*: Rollen klären, Stakeholder strukturiert einbinden, Widerstand als Information lesen, Befähigung gezielt ermöglichen und Wirkung messbar verankern. Aus “Change als Projekt” wird “Change als Betriebssystem”.

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Change-Leadership-Rollen kennen: Sponsor, Change Lead, Process Owner, Line Manager, Champions.
- Erfolgsfaktoren benennen: klares “Warum”, Beteiligung, Quick Wins, psychologische Sicherheit, sichtbare Führung.
- Widerstand als Information verstehen: Interessen, Identität, Überlastung, Vertrauen – nicht als “Sturheit”.
- Sustainment-Mechanik kennen: Routinen, KPIs, Reviews, Adoption-Messung.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Eine Change-Architektur entwerfen (Rollen, Entscheidungswege, Rituale).
- Eine Stakeholderstrategie 2×2 (Einfluss / Betroffenheit) mit Einbindungsstufen erstellen.
- Ein Kommunikationspaket mit Kernbotschaften und Feedback-Mechanismen formulieren.
- Ein Sustainment-Design mit Outcome-, Prozess- und Adoption-KPIs verankern.

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- Transparenz-Regeln für KPIs entscheiden (was wird sichtbar, was nicht, warum).
- Stopp- oder Schwenk-Kriterien für Change-Vorhaben festlegen.
- WIP-Limits für Change-Portfolio definieren – Überlastung vermeiden.
- Trade-off-Protokolle führen (Speed vs. Compliance, Transparenz vs. Angst).

Roter Faden

Change ist nicht das, was im Folien-Plan steht – Change ist das, was nach 6 Monaten noch gilt. Die Disziplin: nicht “managen”, sondern *führen*. Klare Rollen, ehrliche Kommunikation, Widerstand produktiv machen, befähigen, verankern. Wer das nicht durchhält, baut wiederholt dieselben Projekte ohne dauerhaften Effekt. (Kotter, 1996; Lewin, 1951; Schein, 2017)

1. Einstieg: Vom Projekt zum Betriebssystem

Eine Prozessveränderung verläuft selten linear. Sie hat Phasen, in denen alles möglich erscheint, und Phasen, in denen Widerstand und Müdigkeit das Tempo brechen. Diese Dynamik ist nicht “Pech” – sie ist die Regel. Wer sie kennt, kann sie führen.

1.1 Drei klassische Modelle

1. **Lewin (1951):** *Unfreeze – Change – Refreeze*. Das Modell hat sich gehalten, weil es eine wichtige Wahrheit fasst: Veränderung beginnt mit Auftauen alter Muster und endet mit Verankern der neuen. Ohne Refreeze ist alles temporär. (Lewin, 1951)
2. **Kotter (1996):** *Acht Schritte* (Sense of Urgency → Coalition → Vision → Communicate → Empower → Quick Wins → Sustain → Institutionalize). Pragmatischer Leitfaden, der in vielen Organisationen Sprache schafft. (Kotter, 1996)
3. **Schein – Kulturmodell:** drei Schichten: *Artefakte* (sichtbar), *Werte* (kommuniziert), *Grundannahmen* (unbewusst). Nachhaltige Veränderung greift in die zweite und dritte Schicht ein, nicht nur in die erste. (Schein, 2017)

1.2 Change als Betriebssystem, nicht als Projekt

Ein Projekt hat ein Start- und ein Enddatum. Ein Betriebssystem läuft. Drei Indikatoren, dass Change zum Betriebssystem geworden ist:

- Es gibt klare Rollen für Sustainment (nicht nur für die Einführung).
- Es gibt Routinen (Standups, Reviews, Improvement Boards), die nach dem “Go-Live” weiterlaufen.
- Es gibt KPIs, die kontinuierlich gemessen werden – nicht nur in der Projektphase.

Eselsbrücke: U-C-R

Lewin in drei Buchstaben:

Unfreeze – alte Muster auftauen, Dringlichkeit schaffen

Change – neue Praktiken einführen, lernen lassen

Refreeze – verankern, sodass es nicht zurückkippt

Wer das Refreeze auslöst, beginnt das Projekt in 12 Monaten von vorn.

2. Change-Leadership-Rollen: wer macht was?

In jedem Change-Vorhaben treten dieselben Rollen auf – mit unterschiedlichen Verantwortungen. Klare Rollen sind die Basis für alles Weitere.

2.1 Die fünf Kernrollen

- **Sponsor.** Gibt Richtung, Ressourcen, schützt die Veränderung gegen Widerstände auf höherer Ebene, entscheidet bei Konflikten. Ohne Sponsor stirbt der Change beim ersten ernstesten Widerstand.
- **Change Lead.** Orchestriert Kommunikation, Stakeholder, Enablement und Messung. Häufige Aufgabe: Übersetzer zwischen Sponsor, Process Owner, Linie und Champions.
- **Process Owner.** Fachliche Verantwortung. Setzt Standards, definiert KPIs, sichert das Sustainment im Alltag.

- **Line Manager.** Übersetzt die Veränderung in den Alltag des Teams. Entfernt Hindernisse, führt über Verhalten, gibt Feedback.
- **Champions / Multiplikatoren.** Mitarbeitende mit Nähe zur Praxis, informellem Vertrauen, Bereitschaft, Verbesserungen zu testen und Feedback zu sammeln.

2.2 Rollen-Verantwortungen je drei Punkten

Rolle	Drei Kernverantwortungen
Sponsor	Ressourcen sichern; bei Konflikten entscheiden; Veränderung schützen
Change Lead	Stakeholder orchestrieren; Kommunikation gestalten; Wirkung messen
Process Owner	Standards setzen; KPIs definieren; Sustainment sichern
Line Manager	Hindernisse entfernen; Verhalten coachen; Feedback einsammeln
Champions	Verbesserung testen; Feedback bündeln; Vertrauen brücken

2.3 Risikoliste typischer Change-Vorhaben

- Akzeptanzproblem – “Wieder ein Projekt”.
- Überlastung – parallele Initiativen verdrängen einander.
- Zielkonflikt – Speed vs. Compliance, Transparenz vs. Autonomie.
- Fehlende Daten – Baseline unklar, Wirkung kaum messbar.
- Schattenprozesse – offizieller Prozess wird umgangen.
- Fehlende Sponsor-Klarheit – niemand entscheidet bei Konflikten.
- Trainings ohne Praxisbezug – Wissen ohne Verhaltenstransfer.
- Mitarbeiterverlust – Schlüsselpersonen verlassen das Unternehmen.

2.4 Risiko-Hypothesen testen

Senior-Disziplin: nicht alle Risiken werden “vermieden”, manche werden *getestet*. In den ersten zwei Wochen werden zwei Hypothesen aktiv überprüft – mit Mini-Experimenten:

- Hypothese 1: “Operations hat keine Zeit für Schulungen.” Test: Erste Pilot-Schulung von 30 Minuten anbieten, Teilnahmequote messen.
- Hypothese 2: “Fachbereich fürchtet KPI-Kontrolle.” Test: Workshop zu KPI-Designprinzipien (→ “für Lernen, nicht für Bestrafung”), Feedback einholen.

3. Stakeholder-Strategie: wer wird wie eingebunden?

Eine gute Stakeholderstrategie unterscheidet sich von einer schlechten in einem Punkt: sie macht aus Stakeholdern *Beteiligte*, nicht “Betroffene”. Wer als Beteiligter angesprochen wird, hat eine Bringschuld; wer als Betroffener behandelt wird, eine Holschuld nach Information.

3.1 Die 2×2-Matrix: Einfluss vs. Betroffenheit

Eine pragmatische Stakeholder-Klassifikation:

	Niedrige Betroffenheit	Hohe Betroffenheit
Hoher Einfluss	Konsultieren	Mitentscheiden
Niedriger Einfluss	Informieren	Verantworten

Die vier Einbindungsstufen:

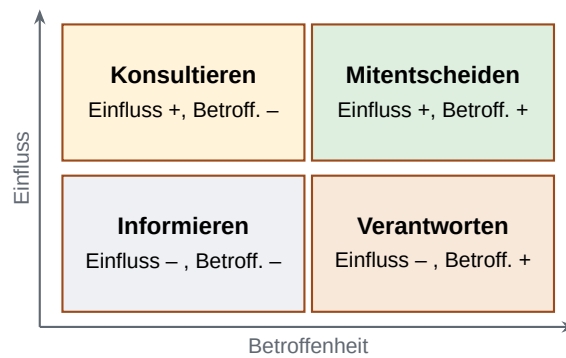


Abbildung 1: Stakeholder-Matrix – Einbindungsstufe je nach Einfluss und Betroffenheit.

- **Informieren.** Status, Termine, Auswirkungen werden mitgeteilt. Ein Kanal genügt, Frequenz angemessen.
- **Konsultieren.** Vor Entscheidungen werden diese Stakeholder gefragt. Nicht stimmberechtigt, aber stimmhabend.
- **Mitentscheiden.** Stakeholder ist Teil der Entscheidung. Voting oder Konsens je nach Thema.
- **Verantworten.** Stakeholder trägt die Konsequenz; ist Teil von Design und Umsetzung.

3.2 Acht typische Stakeholder in Prozessveränderungen

- Operations (Tagesbetrieb).
- Fachbereiche (fachliche Verantwortung).
- IT (technische Umsetzung).
- Compliance (regulatorische Anforderungen).
- Controlling (KPI-Logik, Wirtschaftlichkeit).
- Customer Service (Kundensicht).
- Betriebsrat (Mitbestimmung, wenn relevant).
- Key Customer (externe Wirkung).

3.3 Drei klassische Blockaden

- **Team A (Operations).** “Schon wieder ein Projekt, wir haben keine Zeit.” Antwort: WIP-Limit für Change, Entlastung sichtbar machen, Quick Wins zuerst.
- **Team B (Fachbereich).** “KPI-Steuerung = Kontrolle, wir verlieren Autonomie.” Antwort: Designprinzipien transparent machen, KPIs für Lernen statt Bestrafung, Beteiligung am KPI-Design.
- **Team C (IT).** “Ohne klare Anforderungen wird das nichts.” Antwort: gemeinsame Klärung der Datenquellen, frühe Architektur-Skizze, IT als Mitentscheider.

Widerstand als Information

Widerstand ist selten “Sturheit”. Er ist meistens *Information*: über Interessen, Identität, Überlastung, fehlendes Vertrauen, ungelöste Trade-offs. Die Disziplin: zuhören, bevor man überzeugt. Eine Veränderung, die alle Argumente versteht und keines übergeht, ist robuster als eine, die “durchgedrückt” wird.

4. Kommunikationsarchitektur: Botschaft, Kanal, Feedback

Eine Kommunikationsstrategie ist nicht “viele E-Mails”, sondern eine *Architektur* aus Zielgruppe, Botschaft, Kanal, Frequenz, Feedback. (Kotter, 1996, Kap. 6)

4.1 Drei Botschaftstypen

1. **Was?** Was ändert sich konkret? Welche Prozesse, welche Werkzeuge, welche Termine?
2. **Warum?** Warum jetzt, warum so? Was passiert, wenn wir nicht verändern? Das “Sense of Urgency” nach Kotter.
3. **Was ändert sich für mich?** Die individuelle Sicht. Ohne diese Antwort bleibt jede Botschaft abstrakt.

4.2 Kanal-Mix

Ein Kanal reicht selten. Pragmatischer Mix:

- **Sponsor-Kommunikation** – bei Meilensteinen, in eigener Sprache.
- **Town Hall** – Q&A live, mit dem Mut, schwierige Fragen zu beantworten.
- **Team-Meetings** – Line Manager übersetzen für ihren Bereich.
- **Schriftliche Kanäle** – Newsletter, FAQ, Intranet-Seite mit aktuellem Stand.
- **Feedback-Kanäle** – Pulse Survey, anonymes Signal, offene Sprechstunde.

4.3 Feedback-Mechanismen

Kommunikation ohne Feedback ist eine Predigt. Drei Mechanismen:

- **Pulse Survey** (kurz, häufig). 3–5 Fragen, monatlich.
- **Anonymes Signal** (z. B. ein einfaches Formular für “Sorgen / Hindernisse”). Vertrauliche Rückläufe.
- **Offene Q&A** (Sprechstunde, Town Hall). Live, mit Bereitschaft, “Ich weiß es nicht” zu sagen.

Eselsbrücke: W-W-M

Drei Kernbotschaften, die in jedem Change-Vorhaben beantwortet sein müssen:

Was ändert sich konkret?

Warum jetzt, warum so?

Mich – was ändert sich für mich?

Wer die dritte Frage übergeht, redet an den Menschen vorbei.

5. Sustainment: Verankern statt verpuffen

Die meisten Veränderungen scheitern nicht am Start, sondern am Sustainment. Nach den ersten Erfolgen bricht die Aufmerksamkeit ab, neue Themen drängen sich vor, alte Muster kehren zurück.

5.1 Vier Säulen des Sustainments

1. **Standards.** Was ist die neue “Definition of Done”? Was wird wie protokolliert?
2. **Routinen.** Regelmäßige Rituale (Weekly Standup, Monthly Improvement Board) tragen die Veränderung über Zeit.

3. **Messung.** KPIs werden kontinuierlich erhoben; Abweichungen werden besprochen.
4. **Coaching.** Line Manager und Champions coachen weiter; nicht “Schulung am Anfang, dann fertig”.

5.2 Fünf-Dimensions-KPIs

Wirksamkeit lässt sich in fünf Dimensionen messen:

- **Outcome.** Hat sich das Geschäftsergebnis verbessert? (Kunde, Qualität, Kosten.)
- **Prozess.** DLZ kürzer, Rework geringer, SLA-Quote besser?
- **Adoption.** Wieviele Fälle laufen im neuen Prozess? Wieviele umgehen ihn?
- **Capability.** Wie viele Mitarbeitende haben Training und Coaching abgeschlossen?
- **Culture.** Psychologische Sicherheit, Ownership, Lernbereitschaft (Pulse Survey).

5.3 Definition of Done für Prozessänderungen

Eine pragmatische DoD:

- Modell aktuell und freigegeben.
- Owner benannt und akzeptiert.
- KPIs adjustiert, im Dashboard sichtbar.
- Training durchgeführt für relevante Rollen.
- Monitoring aktiv.
- Erste Iteration der Improvement-Schleife durchlaufen.

5.4 Anti-Gaming bei KPIs

KPIs ohne Schutz vor Manipulation erzeugen oft das Gegenteil dessen, was sie messen sollen:

- KPI “Tickets pro Stunde” → Anreiz, Tickets zu splitten.
- KPI “First-Time-Right” → Anreiz, schwierige Fälle zu vermeiden.
- KPI “Antwortzeit” → Anreiz, leere Antworten zu senden.

Schutz: KPIs koppeln (z. B. “Tickets pro Stunde” nur gültig, wenn Reklamationsquote unter X bleibt). Und: KPI-Transparenz *auf Team-Ebene*, nicht auf Personen-Ebene – außer bei begründetem Einzelfall.

KPIs für Lernen, nicht für Bestrafung

Die wichtigste Designentscheidung in KPI-Systemen: was tun wir, wenn ein KPI nicht erreicht wird? Wenn die Antwort “Konsequenz für die Person” ist, wird der KPI manipuliert. Wenn die Antwort “Lernen, was hindert” ist, wird er ein Steuerungsinstrument. Diese Entscheidung muss vor der KPI-Einführung gefallen sein.

6. Fallstudie: ServiceCo – E2E-Prozessveränderung

ServiceCo hat mehrere Standorte und führt einen workflowgestützten End-to-End-Prozess inkl. KPI-Dashboard und Abweichungsmanagement ein. Ziel: –25 % Durchlaufzeit, –30 % Rework in 12 Wochen.

Restriktionen: Zeitdruck, parallele Projekte, unvollständige Daten, Widerstand gegen KPI-Transparenz, Budget begrenzt.

6.1 Change-Architektur

- **Sponsor.** Bereichsleiter Operations. Entscheidet Zielkonflikte und Ressourcen.
- **Process Owner.** Senior aus Operations. Accountable für Standards und KPIs.
- **Change Lead.** Interne Beraterin. Orchestriert Kommunikation und Enablement.
- **Line Manager.** An jedem Standort, führen Verhalten.
- **Champions.** 2–3 pro Standort, sammeln Feedback und testen Verbesserungen.

Rituale:

- **Weekly Process Standup** (30 min). Standort-Lead + Champions. Kennzahlen, Hindernisse.
- **Monthly Improvement Board** (60 min). Standort-übergreifend. Trade-offs, Standardanpassungen.
- **Quarterly Review** (je nach Kontext). Sponsor + Process Owner + ggf. Compliance.

6.2 Stakeholderstrategie

- Operations: Verantworten (Tagesbetrieb).
- Fachbereich: Mitentscheiden (KPI-Design).
- IT: Mitentscheiden (Controls, Datenfluss).
- Compliance: Mitentscheiden (Audit-Anforderungen).
- Controlling: Konsultieren (KPI-Logik).
- Customer Service: Konsultieren (Sicht des Kunden).
- Betriebsrat: Konsultieren / Mitentscheiden (Datenschutz, Personenbezug).
- Key Customer: Informieren (Veränderungen im Service).

6.3 Kommunikationspaket

- **Kick-off-Botschaft.** “Wir reduzieren Rework, schützen Qualität, geben Teams Klarheit. KPIs sind zur Verbesserung, nicht zur Bestrafung.”
- **Drei Kernbotschaften.** (1) Was sich konkret ändert; (2) Warum jetzt; (3) Was sich für mich ändert (rollenspezifisch).
- **Zwei Kanäle.** Town Hall am Anfang + monatlicher Newsletter mit Fortschritt.
- **Feedback.** Offene Q&A + anonymer Pulse Survey monatlich.

6.4 Sustainment-Design

- **KPI-Set.**
 - Outcome: SLA-Quote, Kundenzufriedenheit.
 - Prozess: DLZ, Rework.
 - Adoption: Anteil Fälle im Workflow, Exception-Rate.
 - Capability: Trainingsabschluss, Coaching-Check.
- **Review-Board.** Monthly Improvement Board, mit Protokoll und Aktionen.
- **Trainings- und Coaching-Plan.** Drei Stufen: Operator-Schulung, Champion-Workshop, Coaching für Line Manager.
- **Definition of Done.** Modell aktuell, Owner benannt, KPIs angepasst, Training durchgeführt, Monitoring aktiv.

6.5 Entscheidungen unter Unsicherheit

1. **Speed vs. Compliance.** MVP mit Ausnahmeprozess + Audit Trail; nicht “erst alle Kontrollen perfekt, dann starten”.
2. **Transparenz-Regel.** Team-Performance sichtbar; individuelle Personenmetriken nur bei begründetem Incident-Case (Guardrail).

Trade-off-Protokoll: jede dieser Entscheidungen wird im Improvement Board protokolliert – inklusive verworfener Alternativen und Frühwarnsignal (“Wenn KPI-Akzeptanz unter X fällt, reviewen wir die Transparenz-Regel.”).

7. Coaching: Führung = Verhalten, Entscheidungen, Schutz

Change-Leadership ist nicht “mehr Folien”. Es ist eine Kombination aus drei Disziplinen:

7.1 Verhalten

- Vorleben statt verkünden. Ein Sponsor, der die neuen Routinen ignoriert, hebt sie sofort aus.
- Sichtbar in den Rituals. Erscheinen, fragen, zuhören.
- “Was tust du ab morgen anders?” – die Frage, die Verhaltenstransfer sichert.

7.2 Entscheidungen

- Zielkonflikte explizit entscheiden. Niemand kann gleichzeitig Speed, Qualität, Compliance und niedrige Kosten optimieren.
- Klare Stop-Bedingungen. Wann wird ein Change-Vorhaben gestoppt oder neu geschnitten?
- Trade-off-Protokoll. Jede schwierige Entscheidung mit verworfenen Alternativen und Frühwarnsignal.

7.3 Schutz

- Teams vor parallelen Initiativen schützen (WIP-Limit für Change).
- Psychologische Sicherheit – wer Fehler meldet, wird nicht bestraft.
- Ressourcen sichern, wenn der Sponsor an anderer Stelle reduzieren will.

7.4 Coaching-Interventionen

- **Aktives Zuhören.** “Was genau bereitet Ihnen Sorge?”
- **Reframing.** “Sehe ich richtig, dass Sie auf ein Risiko hinweisen – nämlich X?”
- **Konfliktmoderation.** Trade-offs sichtbar machen statt zu schlichten.
- **Commitment.** “Was tun Sie ab morgen anders?”

8. Management-Perspektive: Change als Lernsystem

Auf Wissens-Ebene ist Change ein Modell. Auf Anwendungs-Ebene ist es ein Projekt. Auf Management-Ebene ist es ein *Lernsystem* – mit Portfolio, Cadence, Feedback und Korrektur.

8.1 Top-10-Change-Entscheidungen

1. Welche Initiativen werden parallel zugelassen (WIP-Limit)?
2. Welche Ressourcen sind reserviert (Sponsor-Disziplin)?

3. Welche KPI-Transparenz wird zugelassen (Team / Person)?
4. Welcher Ausnahmeprozess gilt?
5. Welche Eskalationspfade existieren?
6. Welche Kommunikationsregeln (Frequenz, Kanäle)?
7. Welche Trainings-Investitionen sind verbindlich?
8. Welche Stopp-Kriterien werden definiert?
9. Welche Rituale sind verbindlich (Standup, Improvement Board)?
10. Welche Sustainment-DoD gilt?

8.2 Portfolio-Steuerung für Change

- **WIP-Limit.** Eine Organisation hält eine bestimmte Zahl gleichzeitiger Veränderungen aus. Wer mehr startet, riskiert, dass alle scheitern.
- **Priorisierung.** Welche Initiativen sind “must do”, welche “nice to do”?
- **Entlastungs-Mechanismus.** Wenn eine neue Initiative startet, was wird parallel pausiert?

8.3 Truth Signals

Wie erkennt man, ob eine Veränderung wirklich angekommen ist – nicht nur “offiziell läuft”?

- **Adoption-Rate.** Wieviele Fälle laufen tatsächlich im neuen Prozess?
- **Schattenprozess-Indikatoren.** Werden Workarounds (Excel, Mail) immer noch genutzt?
- **Pulse Survey.** Wie schätzen Mitarbeitende selbst den Stand ein?
- **Outcome-Verbesserung.** Hat sich das gemessene Geschäftsergebnis bewegt?

8.4 Risikomodell

- **Widerstandstypen.** Identität, Überlastung, Vertrauen, Interessen.
- **Überlastungsindikatoren.** Krankenstand, Pulse Survey, sinkende Adoption-Rate.
- **KPI-Gaming-Erkennung.** Plötzliche, unplausible Verbesserung; Diskrepanz zwischen KPI und Kundenfeedback.
- **Schatten-Prozesse.** Anstieg von Workarounds, sinkende Workflow-Quote.

Schluss-Merksatz für Tag 15

Change ist ein **Lernsystem**: klare Rollen, ehrliche Kommunikation, ehrliche Messung, Widerstand als Information, kontinuierliche Verbesserung. Wer Change “managen” will wie ein Projekt, baut wiederkehrende Initiativen ohne Verankerung. Wer Change *führt* wie ein Betriebssystem, schafft eine Organisation, die sich verändern *kann*.

9. Take-aways aus Tag 15

1. **Lewin, Kotter, Schein** sind die drei Grundmodelle – Unfreeze/Change/Refreeze, 8 Steps, Kulturmodell.
2. **Fünf Kernrollen** klären: Sponsor, Change Lead, Process Owner, Line Manager, Champions.
3. **Widerstand ist Information**, keine Sturheit. Erst zuhören, dann gestalten.
4. **Stakeholder 2x2**: Informieren / Konsultieren / Mitentscheiden / Verantworten.
5. **Drei Kernbotschaften** pro Change-Vorhaben: Was, Warum, Was für mich.

6. **Sustainment in vier Säulen:** Standards, Routinen, Messung, Coaching.
7. **KPIs für Lernen, nicht für Bestrafung;** mit Kopplungen gegen Gaming.
8. **Change ist Lernsystem,** kein Projekt. WIP-Limits und Truth Signals als Steuerungsinstrumente.

10. Literatur

Im Skript verwendete und für die Vertiefung empfohlene Quellen. Zitierstil: APA-7.

Edmondson, A. C. (1999).

Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>

Kotter, J. P. (1996).

Leading change. Harvard Business School Press.

Kotter, J. P. (2012).

Leading change: With a new preface. Harvard Business Review Press.

Lewin, K. (1951).

Field theory in social science: Selected theoretical papers. Harper & Row.

Project Management Institute. (2021).

A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Rogers, E. M. (2003).

Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.

Schein, E. H. (2017).

Organizational culture and leadership (5th ed.). Jossey-Bass.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014).

Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Review Press.

11. Glossar

Die wichtigsten Begriffe des Tages – kurz definiert, in alphabetischer Reihenfolge.

Adoption-Rate

Anteil der Fälle, die tatsächlich im neuen Prozess laufen. Truth-Signal-Indikator.

Anti-Gaming (KPI)

Designprinzip: KPIs koppeln, sodass Manipulation an einer Stelle eine andere verschlechtert.

Champion

Mitarbeitender mit Nähe zur Praxis und informellem Vertrauen, der Verbesserungen testet und Feedback sammelt.

Change Lead

Person, die Kommunikation, Stakeholder und Enablement in einer Veränderung orchestriert.

Change-Architektur

Sammlung der Rollen, Entscheidungswege und Rituale einer Veränderung.

Definition of Done (Change)

Pragmatische Kriterienliste, wann eine Prozessänderung wirklich abgeschlossen ist.

Improvement Board

Regelmäßiges Gremium (z. B. monatlich), das Trade-offs und Standardanpassungen entscheidet.

Kotter (8 Steps)

Modell zur Führung von Veränderungen in acht Phasen. (Kotter, 1996)

Lewin (Unfreeze/Change/Refreeze)

Dreischrittmodell der Veränderung. (Lewin, 1951)

Line Manager

Führungskraft, die die Veränderung in den Alltag des Teams übersetzt.

Process Owner

Fachliche Verantwortung für Standards, KPIs und Sustainment.

Pulse Survey

Kurze, häufige Befragung zu Stand und Stimmung; 3–5 Fragen, monatlich.

Psychologische Sicherheit

Klima, in dem Mitarbeitende Risiken eingehen und Fehler melden können, ohne bestraft zu werden. (Edmondson, 1999)

Refreeze

Verankerung neuer Praktiken (Standards, Routinen, KPIs), sodass Rückfall verhindert wird.

Rituale

Verbindliche, wiederkehrende Termine wie Standup, Review, Improvement Board.

Schein-Kulturmodell

Dreischicht-Modell der Organisationskultur: Artefakte, Werte, Grundannahmen. (Schein, 2017)

Sponsor

Senior-Führungskraft, die Richtung, Ressourcen und Schutz für eine Veränderung sichert.

Sustainment

Mechanismen, die eine Veränderung über Zeit verankern: Standards, Routinen, Messung, Coa-

ching.

Trade-off-Protokoll

Dokumentation einer Entscheidung mit verworfenen Alternativen und Frühwarnsignal.

Truth Signal

Indikator, der zeigt, ob eine Veränderung wirklich angekommen ist (Adoption, Outcome, Pulse, Schattenprozess).

WIP-Limit (Change)

Obergrenze paralleler Change-Initiativen; verhindert Überlastung.

Lernplatt · by Can Siebert · Kurs 71 (Dig 42) · Tag 15 · © 2026
